

РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ – 3 414 КМ

а/д «Семей – Калбатау»
км 756-870 – устройство покрытия
Общая протяженность – 20 км (выборочно)
Общая стоимость – 910 млн. тг.

а/д «Семей – Кайнар»
км 132-182 – ресайклирование
Общая протяженность – 50 км
Общая стоимость – 1 758 млн. тг.

а/д «Семей – Кайнар»
км 208-240 – ресайклирование
Общая протяженность – 12 км (выборочно)
Общая стоимость – 434 млн. тг.

а/д «Алматы – Усть-Каменогорск»
Протяженность – 454 км
Ввод эксплуатацию – 223 км
Открытие движение – 231 км
Срок реализации – 2017-2022 гг.
Стоимость – 162 млрд. тг

а/д «Караганды – Аягоз»
км 620-660, 660-704 – реконструкция
Общая протяженность – 84 км
План на 2021 год – 50 млн. тг.
Период реализации – 2021-2022 гг.

а/д «Таскескен – Бахты»
Протяженность - 20 км
Ввод в эксплуатацию – 20 км
Срок реализации – 2017-2021 гг.
Общая стоимость – 4 млрд.тг

а/д «Аягоз – Тарбагатай – Бугаз»
км 793-849 – устройство покрытия
Общая протяженность – 56 км
Общая стоимость –2 435 млн. тг.

а/д «Калбатау – Майкапшагай»
Протяженность – 415 км
Ввод эксплуатацию – 52 км
Открытие движение – 363 км
Срок реализации – 2017-2022 гг
Стоимость – 157 млрд. тг.

а/д «Омск-Майкапшагай – Маркакол»
км 46-70 – устройство покрытия
Общая протяженность – 18 км (выборочно)
Общая стоимость – 420 млн. тг.

а/д «Усть-Каменогорск – Рахман. ключи»
Протяженность – 32 км
Корректировка ПСД
Финансирование на 2021 г. – 500 млн. тг.

а/д «Усть-Каменогорск – Рахман. ключи»
км 308-337 – устройство покрытия
Общая протяженность – 29 км
Общая стоимость – 844 млн. тг.

а/д «Усть-Каменогорск – Семей»
км 8-66,156-198 – реконструкция
Общая протяженность – 100 км
План на 2021 год – 50 млн. тг.
Период реализации – 2021-2022 гг.



Условные обозначения	
█	Реконструкция (заим) – 869 км
█	Реконструкция (РБ) – 52 км
█	Разработка ПСД – 184 км
█	Средний ремонт – 185 км
█	Содержание – 2 520 км

Реконструкция автодороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» и «Калбатау – Майкапшагай»

«Талдыкорган – Усть-Каменогорск» км 615-1073

Протяженность – **454 км**
В т.ч.: I категория – 5 км
II категория – 449 км
Стоимость – **161,6 млрд.тг**

Подрядная организация:
CITIC Construcion Co., Ltd,
АО «К-Дорстрой»,
ТОО «Тодини Централ Азия»

Технический надзор: **ТОО «ZS ENGINEERING»**

Период реализации: **2017-2022 гг.**

CITIC Construcion Co., Ltd.:

Протяженность – **70 км**
В т.ч.: II категория – 70 км.

АО «К-Дорстрой»:

Протяженность – **195 км**
В т.ч.: II категория – 195 км.

ТОО «Тодини Централ Азия»:

Протяженность – **188 км**
В т.ч.: I категория – 5 км
II категория – 183 км.

Мобилизовано:
1 204 ед. техники
1 873 чел. персонала



«Калбатау - Майкапшагай» км 906-1321

Протяженность – **415 км**
В т.ч.: II категория – 415 км

Стоимость – **157 млрд.тг**

Подрядная организация:
ТОО «Китайская компания по
строительству и развитию Синьсин»
ТОО «СП КазГерСтрой»

Технический надзор: **ТОО «ЮВПЭК-Астана»**

Период реализации: **2017-2022 гг.**

ТОО «СП КазГерСтрой»:

Протяженность – **204 км**
В т.ч.: II категория – 184 км

ТОО «Китайская компания по

строительству и развитию Синьсин»:
Протяженность – **211 км**
В т.ч.: II категория – 231 км

Мобилизовано:
1 142 ед. техники
2 037 чел. персонала

План займовым проектам 2021 года

В 2021 году предлагается сдать в эксплуатацию 275 км, в том числе: а/д «Талдыкорган-Калбатау-

Усть-Каменогорск» - 223 км (8,10,11,14,15,16 лот)

а/д «Калбатау-Майкапшагай» - 52 км (1,8 лот)

Остальные участки – открытие движения автотранспорта по асфальтобетонному покрытию – 594 км, из них:

а/д «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» - 231 км (6,7,9,12,13 лот)

а/д «Калбатау-Майкапшагай» - 363 км (2,3,4,5,6,7,9,10 лот)

Реконструкция а/д «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» км 615-685 участок «гр. Алмтинской обл. – Таскескен» Генподрядчик: CITIC Construction Co.LTD / ТОО «АстанаАвтоСтрой»

Основные технические показатели

Общая протяженность - 71,77 км
 Категория дороги: - II
 Стоимость проекта - 20,6 млрд. тг.
 Период реализации - 2019-2022 г.

График выполнения работ

Виды работ	ед.изм	Всего по Контракту	Выполнено всего	Остаток работ
Верхний слой покрытия	км	71,77	0	71,77
Нижний слой покрытия	км	71,77	27,3	44,47
Верхний слой основания	км	71,77	28,86	42,91
Нижний слой основания	км	71,77	31,9	39,87
Подстилающий слой	км	71,77	34,22	37,55
Земляное полотно	км/тыс.м3	71,77/1520	37/1104	34,77/416

Заготовка дорожно-строительных материалов на 2021 год

Участок	Щебень тыс. м3	Битум тыс. тн.	ЖБИ тыс. м3
	Факт	Факт	Факт
км 615-685	199,45	7,37	0,86

Условные обозначения


-  Асфальтобетонный завод
-  Дробильно-сортировочная установка
-  Производственная база
-  Битумная яма (3 500тн)

Мобилизации на 2021 г.

Мобилизации	ед.изм	Факт
Техника	ед.	64
Персонал	чел.	128



Реконструкция а/д «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» участок км 685-880 «Таскескен–Жарма» АО «К-Дорстрой»

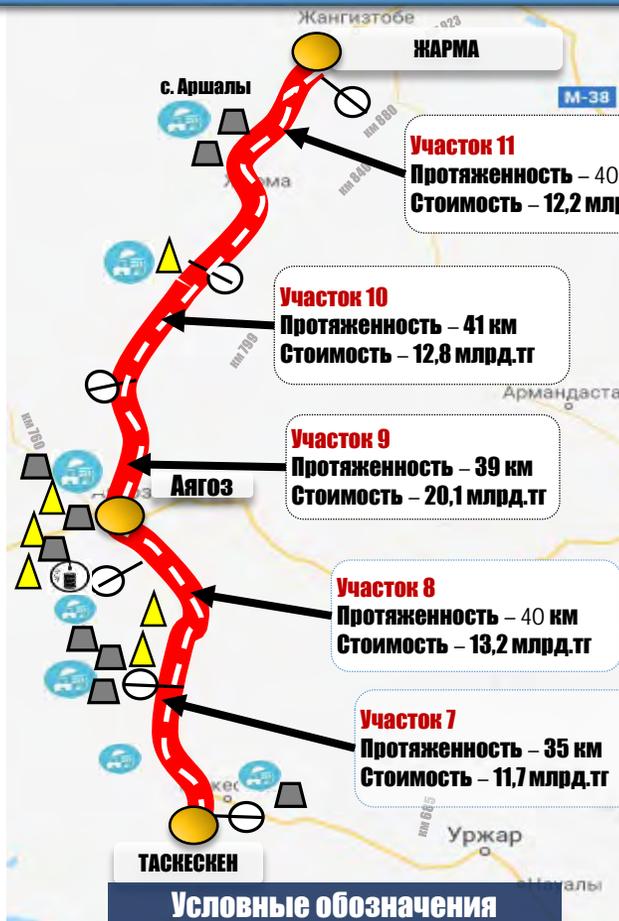

- ▲ Асфальтобетонный завод
- ▴ Дробильно-сортировочная установка
- ⊕ Производственная база
- ⊕ Битумная яма (2 800 тн)

Мобилизации на 2021 г.

Мобилизации	ед.изм	Факт
Техника	ед.	379
Персонал	чел.	687

Основные технические показатели

Общая протяженность	- 195 км
Категория дороги:	- II
Стоимость проекта	- 70 млрд. тг.
Период реализации	- 2019-2022 г.


График выполнения работ

Виды работ	ед.изм.	Всего по Контракту	Выполнено всего	Остаток работ
Верхний слой покрытия	км	195	4,7	190,3
Нижний слой покрытия	км	195	97	98
Верхний слой основания	км	195	101	94
Нижний слой основания	км	115	83	32
Подстилающий слой	км	195	124	71
Земляное полотно	км	195	129	66
	тыс.м3	5 632	4 094	1 538

Заготовка дорожно-строительных материалов на 2021 год

Участок	Щебень тыс. м3	Битум тыс. тн.	ЖБИ тыс. м3
	Факт	Факт	Факт
№7 км 685-720	35,88	1,15	
№8 км 720-760	88,48	0,98	
№9 км 760-799	67,07	0,32	1,2
№10 км 799-840	68,28	0,75	
№11 км 840-880	108,38	2,8	
ВСЕГО	368,09	6,0	1,2

Реконструкция а/д «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» км 880-1073 участок «Жарма – Усть-Каменогорск» ТОО «Тодини Централ Азия» / ТОО «СП «СинеМидасСтрой»

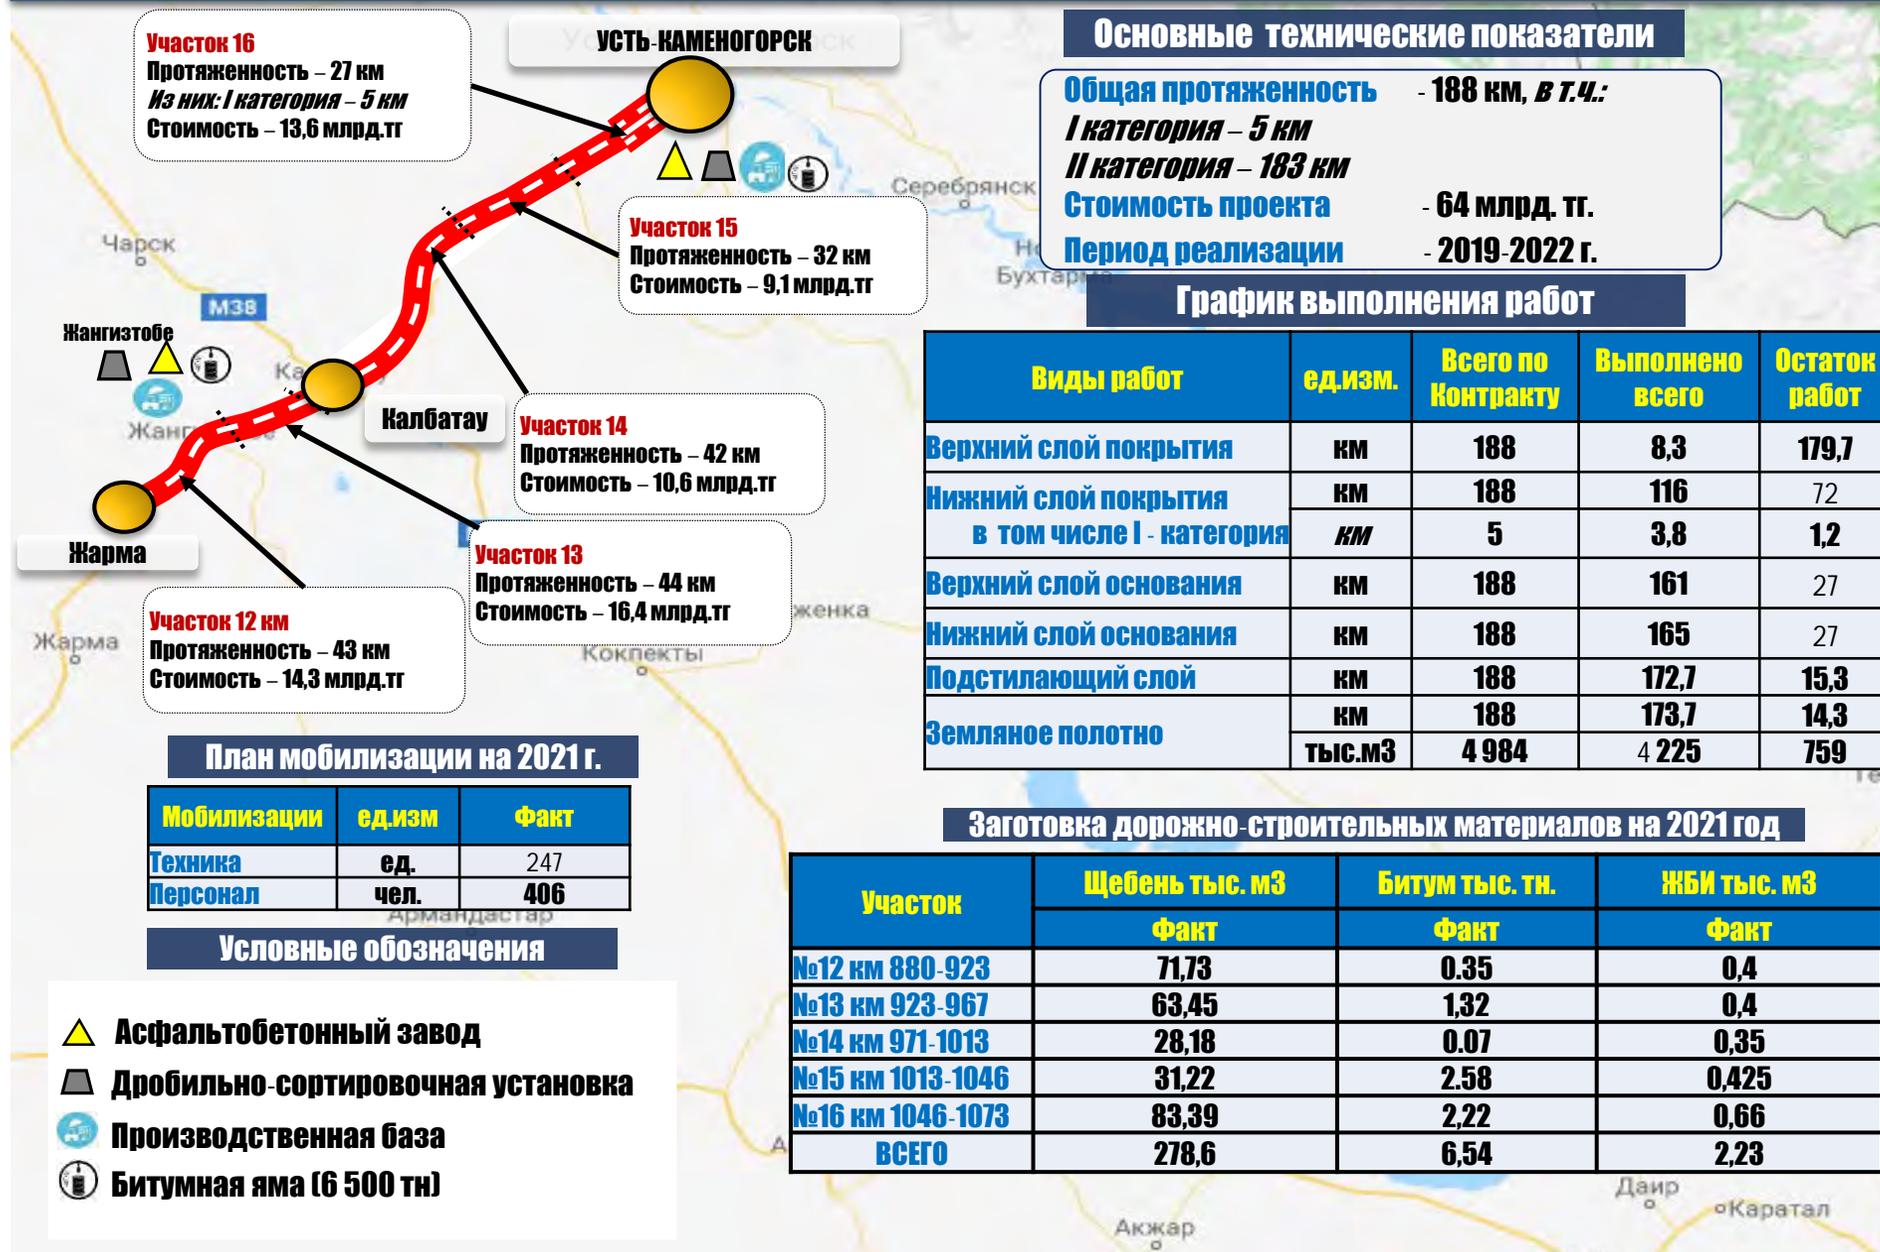

Участок 16
Протяженность – 27 км
Из них: I категория – 5 км
Стоимость – 13,6 млрд.тг

Участок 15
Протяженность – 32 км
Стоимость – 9,1 млрд.тг

Участок 14
Протяженность – 42 км
Стоимость – 10,6 млрд.тг

Участок 13
Протяженность – 44 км
Стоимость – 16,4 млрд.тг

Участок 12 км
Протяженность – 43 км
Стоимость – 14,3 млрд.тг

Основные технические показатели

Общая протяженность - 188 км, в т.ч.:
I категория – 5 км
II категория – 183 км
Стоимость проекта - 64 млрд. тг.
Период реализации - 2019-2022 г.

График выполнения работ

Виды работ	ед.изм.	Всего по Контракту	Выполнено всего	Остаток работ
Верхний слой покрытия	км	188	8,3	179,7
Нижний слой покрытия в том числе I - категория	км	188	116	72
	км	5	3,8	1,2
Верхний слой основания	км	188	161	27
Нижний слой основания	км	188	165	27
Подстилающий слой	км	188	172,7	15,3
Земляное полотно	км	188	173,7	14,3
	тыс.м3	4 984	4 225	759

План мобилизации на 2021 г.

Мобилизации	ед.изм	Факт
Техника	ед.	247
Персонал	чел.	406

Условные обозначения

- Асфальтобетонный завод
- Дробильно-сортировочная установка
- Производственная база
- Битумная яма (6 500 тн)

Заготовка дорожно-строительных материалов на 2021 год

Участок	Щебень тыс. м3	Битум тыс. тн.	ЖБИ тыс. м3
	Факт	Факт	Факт
№12 км 880-923	71,73	0,35	0,4
№13 км 923-967	63,45	1,32	0,4
№14 км 971-1013	28,18	0,07	0,35
№15 км 1013-1046	31,22	2,58	0,425
№16 км 1046-1073	83,39	2,22	0,66
ВСЕГО	278,6	6,54	2,23
